

GUIDA PRIMA ACCENSIONE Aduro Hybrid


Maggiori informazioni nel manuale d'uso e manutenzione della stufa.

IMPORTANTE: L'installazione va effettuata in ottemperanza alle leggi vigenti e da personale specializzato. La garanzia non copre eventuali danni dovuti ad installazione o utilizzo non corretto.

CONTROLLARE INSTALLAZIONE STUFA

Verificare:

- Corretta connessione alla canna fumaria
- Corretto apporto di aria comburente
- Se presente, connessione stagna
- Rispetto delle distanze di sicurezza dai materiali infiammabili
Maggiori informazioni nella parte 2.1 del manuale
- Rispetto della distanza minima di 10 cm dal muro posteriore
Maggiori informazioni nella parte 2.1 del manuale
- Posizione vermiculite e deflettore
- Testare switch aria pellet, leva aria primaria e Aduro-tronic
Maggiori informazioni nella parte 3.3.1 del manuale

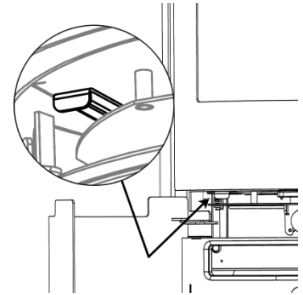

Switch aria pellet

CONTROLLARE TIRAGGIO:

- 5 Pa a freddo
- 18-25 Pa ad un'ora dall'accensione

CONNETTERE LA STUFA ALLA RETE ELETTRICA

- Verificare che la fase della presa elettrica corrisponda alla fase della scheda madre



Carica pellet

CONNETTERE LA STUFA ALLA APP

- Installare la App via App Store o Google Play.
- Seguire la procedura di connessione illustrata sullo schermo
- Connettere alla rete WiFi
- Effettuare l'aggiornamento (firmware stufa) se richiesto
- Collegare lo smartphone alla rete Aduro della stufa

RIEMPIRE IL SERBATOIO PELLETT

- Carico massimo c.ca 16kg
- Rimuovere copertura bruciatore
- Aprire il menu di servizio
 - Cliccare su "manuale", cliccare su "modalità manuale"
 - Attivare su "coclea esterna"
- Appena il pellet raggiunge 2cm sotto il bruciatore
 - Disattivare coclea "esterna"
 - Rimuovere eventuale pellet in eccesso
 - Posizionare cover bruciatore



Copertura bruciatore

v1.43.11

d) PRIMA ACCENSIONE

- Aprire Aduro H1 App.
- Cliccare su "Impostazioni", "On/Off"
- Verificare corretta accensione stufa
 - Annotare temperatura su checklist
- Regolare su:
 - Potenza step 1
 - Potenza step 2
 - Potenza step 3
 - Annotare risultato su checklist
- (Opzionale) Testare combustione legna
 - Annotare temperatura su checklist

- Informare il cliente sulle funzioni della stufa e sulla manutenzione obbligatoria
- La stufa é installata correttamente ed é pronta all'uso.
 - Maggiori informazioni sul manuale parte 3.4



Aduro H1 App logo



Settings icon



Power icon

e) RIEMPIRE LA CHECKLIST- ANNEX 1

- Riempire la checklist con tutte le informazioni e inviare a info@aduro.dk
 - Obbligatorio per attivare la garanzia



*Power settings icon
Level 1/2/3*

CHECKLIST PRIMA ACCENSIONE

Riempire completamente e inviare a info@aduro.dk

| | | | | |
|--------------|---|---|---|--|
| Info azienda | Stufa acquistata presso (azienda) | | | |
| | Cittá | | Nome tecnico/azienda | |
| | Data di acquisto | | Tecnico certificato | |
| | Data di installazione | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Info cliente | Nome cliente | | | |
| | Indirizzo cliente | | | |
| | Cittá | | Cellulare (+) | |
| | Email | | | |
| Info stufa | Modello stufa | | Numero di produzione | |
| | Serie No. | | Password | |
| Aria esterna | Installazione | | | |
| | 1. Connessione stagna? | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| | Diametro (cm) | | Lunghezza | |
| Posizione | 2. Distanza dal retro | | Minimo 10 cm | |
| | 3. Distanza dai materiali infiammabili (sx) | | Minimo 80 cm | |
| | 4. Distanza dai materiali infiammabili (dx) | | Minimo 80 cm | |
| Tiraggio | 5. Tiraggio rilevato | | 18/25 PA ad un'ora da accensione | |
| | 6. Tiraggio stabile? | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| | Un tiraggio instabile compromette corretto funzionamento | | | |
| Danni | 7. Stabilizzatore tiraggio/Aduro DraftOptimizer installato? | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| | 8. La stufa é danneggiata? | | Se "si" inviare un reclamo a service@aduro.dk | |
| | Vernice | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Vermiculite | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |
| Vetro | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |
| Aduro Tronic | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | |


Installazione

Schema installazione:

Installazione



Installazione standard

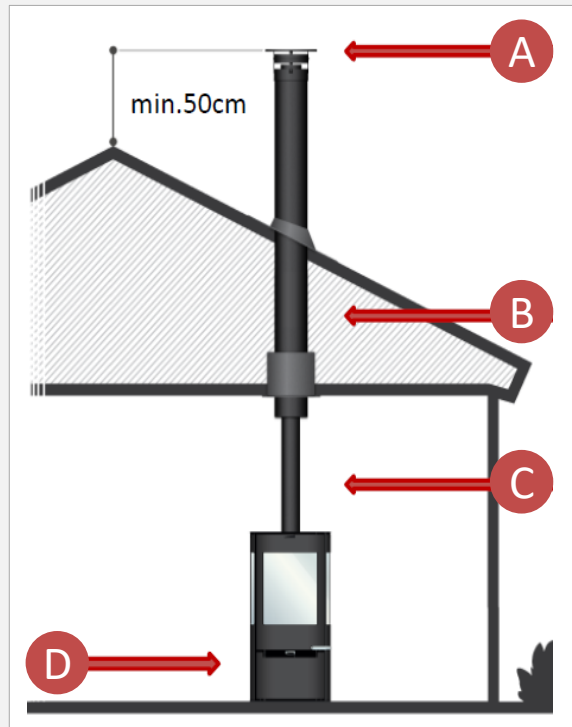

Caratteristiche impianto

- A: Antipioggia/antivento Segnare ✓
- B: Doppia parete (lunghezza) m
- C: Parete singola (lunghezza) m
- D: Connessione esterna Segnare ✓

IMPORTANTE:

L'installazione deve essere conforme alle leggi vigenti.

Connettività

1. Segnale Wi-Fi stabile e costante?

SI

NO

IMPORTANTE:

Una connessione Wi-Fi stabile é indispensabile per l'utilizzo delle funzioni legate al Cloud, controllo remoto e diagnostica - maggiori informazioni sul manuale parte 2.5

Aduro Ibrida – checklist installazione e connessione

Checklist

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Distanza minima 10cm dal retro | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 2. Connessione elettrica a norma | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 3. Connessione App | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 4. Connessione Wi-Fi/Cloud | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 5. Pellet caricato correttamente | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 6. Test aria primaria e Aduro Tronic | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |
| 7. Switch aria pellet disattivato | <input type="checkbox"/> | Obbligatorio, segnare ✓ |

Aduro Ibrida – checklist prima accensione

Accensione

- | | | |
|--|--------------------------------|------------|
| 1. Accensione via app | <input type="checkbox"/> | Segnare ✓ |
| 2. Temperatura dopo 20 minuti da comparsa fiamma | <input type="text" value="C"/> | Minimo 90C |

Regolazione

- | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 3. Livello 1 (via app) | <input type="checkbox"/> | Ventola | <input type="checkbox"/> | Coclea |
| 4. Livello 2 (via app) | <input type="checkbox"/> | Ventola | <input type="checkbox"/> | Coclea |
| 5. Livello 3 (via app) | <input type="checkbox"/> | Ventola | <input type="checkbox"/> | Coclea |

Legna

- | | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| 6. Accensione legna (2kg di legna) | <input type="checkbox"/> | Segnare ✓ |
| 7. Temperatura dopo 30 minuti carica legna | <input type="text" value="C"/> | Minimo 280C |

Commenti installatore

Data e luogo

Nome tecnico/azienda

Timbro e firma
